



ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1081

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (Αναθεωρητικού) του έργου «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων».

Στη Λάρισα σήμερα 03-12-2024 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00 μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 61790/29-11-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτρης, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος και 8) Αγορίτσας Χρήστος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βλαχούλης Κωνσταντίνος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (Αναθεωρητικού) του έργου «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 482/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων».
5. Τη με αριθμ. 2110/2022 Απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων.
6. Τη με αριθμ. 499/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης, για το έργο «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων».
7. Τη με αριθμ. 753/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 899/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 319/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων».
10. Τη με αριθμ. 491/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων».
11. Τη με αρ. πρωτ. 61443/27-11-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	74.391,65 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2 ^{ου} Α.Π.Ε.	69.531,41 €

Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7333.46009
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

12. Την από 27-11-2024 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη

1. Την υπ' αριθμ. 347/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων με θέμα «Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2022, Τεχνικού Προγράμματος και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022 Δήμου Λαρισαίων και Νομικού Προσώπου»
2. Την υπ' αριθμ. 2110/2022 απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων με θέμα «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης»
3. Την υπ' αριθμ. 482/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ'»
4. Την υπ' αριθμ. 499/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα «Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης για το έργο 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ'»
5. Την υπ' αριθμ. 753/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα «Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ' και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»
6. Την υπ' αριθμ. 899/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: «Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ' και κατακύρωση αυτού», η οποία ανακηρύσσει ανάδοχο της εκτέλεσης του παραπάνω έργου τον οικονομικό φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 11,10% (έντεκα και δέκα εκατοστά τοις εκατό) επί του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου
7. Την από 19/12/2022 υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ότι δεν έχουν επέλθει ονιγενείς μεταβολές στο πρόσωπό του κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016
8. Την σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 28/12/2022 με αρ. πρωτ. 57328/28-12-2022 για το έργο με τίτλο 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ'
9. Την υπ' αριθμ. 319/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ'
10. Την με αριθμ. πρωτ. 43299/31-08-2023 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ'
11. Την τελική επιμέτρηση του έργου με τίτλο 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ'. θεωρημένη από τον Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών στις 15/09/2024
12. Την υπ' αριθμ. 491/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ'.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απολογιστικές δαπάνες και τις αναθεωρήσεις του έργου. Οι αναθεωρήσεις αφορούν στα τρίμηνα 2^ο 2023, 3^ο 2023, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που επισυνάπτονται.

Το κονδύλιο των απροβλέπτων αναλώνεται κατά το ποσό των **0,04 €**.

Η συνολική δαπάνη του 3^{ου} Α.Π.Ε. διαμορφώνεται σε **69.531,41€** (με Φ.Π.Α.), με υπέρβαση κατά **2.959,12 €** σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Παραμένει αμετάβλητη

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Παραμένει αμετάβλητη

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Παραμένει αμετάβλητη

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 2^ο ΑΠΕ

Δεν υπάρχουν

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 2^ο ΑΠΕ

Δεν υπάρχουν

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 2^ο ΑΠΕ

Δεν υπάρχουν

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Απορροφούνται **0,04 €** από τα **0,04 €** του 2^{ου} ΑΠΕ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Μειώνεται η δαπάνη σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ κατά **3.383,95 €**

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. : **1.555,75 €**

Εγκεκριμένος 1^{ος} Α.Π.Ε. χωρίς Φ.Π.Α. : **1.555,75 €**

Εγκεκριμένος 2^{ος} Α.Π.Ε. χωρίς Φ.Π.Α. : **1.555,75 €**

Προτεινόμενος 3^{ος} Α.Π.Ε. χωρίς Φ.Π.Α. : **7.326,13 €**

Αυξάνεται η δαπάνη σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ κατά **5.770,38 €**

Φ.Π.Α.

Αυξάνεται η δαπάνη κατά **572,73 €**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Εγκεκριμένη δαπάνη με Φ.Π.Α. : **66.572,29 €**

Εγκεκριμένος 1^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **66.572,29 €**

Εγκεκριμένος 2^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **66.572,29 €**

Προτεινόμενος 3^{ος} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. : **69.531,41€**

Αυξάνεται η δαπάνη σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ κατά **2.959,12 €**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 3^{ου} Α.Π.Ε.

A / A	Ομάδα Εργασιών	Δαπάνες Εγκεκριμένου 2 ^{ου} ΑΠΕ	Προτεινόμενες Δαπάνες 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	Διαφορές Δαπανών
1	A : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	2.212,21	2.212,21	0,00
2	B : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	7.363,91	7.363,91	0,00
3	Γ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	31.457,34	31.457,34	0,00
Άθροισμα		41.033,46	41.033,46	0,00
Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%		7.386,02	7.386,02	0,00
Άθροισμα (Σ1)		48.419,48	48.419,48	0,00
Απρόβλεπτα		0,04		-0,04
Αξία έργου με απρόβλεπτα (Σ2)		48.419,52	48.419,48	-0,04
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		3.200,00	282,84	-2.917,16
ΓΕ & ΟΕ 18% απολογιστικών		512,06	45,27	-466,79
Σύνολο Απολογιστικών		3.712,06	328,11	-3.383,95
Πρόβλεψη Αναθεώρησης		1.555,75	7.326,13	5.770,38
Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ (Σ3)		53.687,33	56.073,72	2.386,39
Δαπάνη Φ.Π.Α. (24%)		12.884,96	13.457,69	572,73
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. (Σ4)		66.572,29	69.531,41	2.959,12

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή :

- Με τον 3^ο ΑΠΕ δεν πραγματοποιείται καμία μεταβολή στο φυσικό αντικείμενο του έργου και το έργο καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό
- Με τον 3ο ΑΠΕ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναθεώρησης των εργασιών

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

την έγκριση του 3ου ΑΠΕ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων και υπογράφηκαν χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Λάρισα 27/11/2024

Ο επιβλέπων

ΝΕΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Λάρισα 27/11/2024

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ


ΔΑΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Λάρισα 27/11/2024

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχ/κος Π.Ε. με
Α'β

13. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Οδοστρωμάτων», ο οποίος έχει ως εξής:

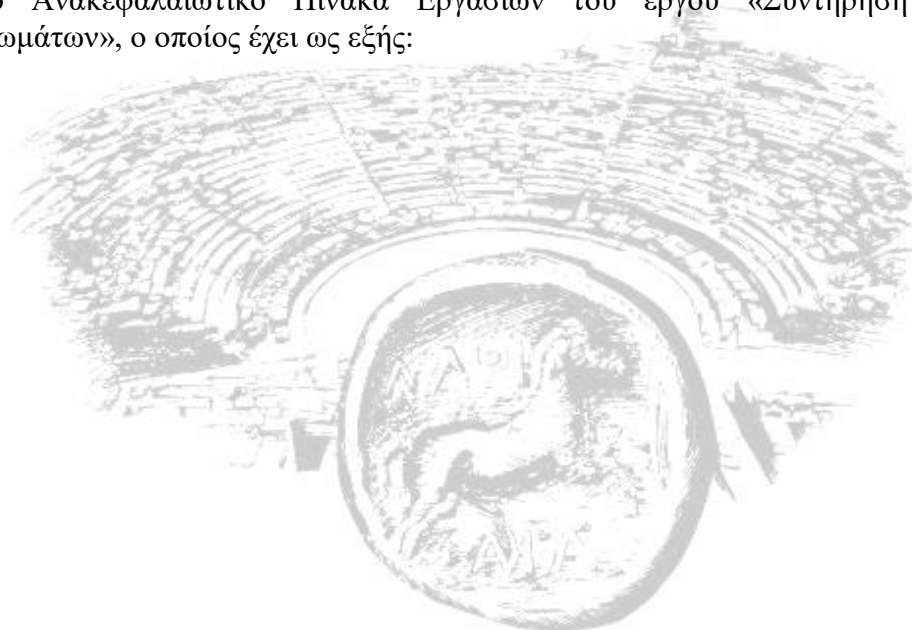

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α. 30.7333.46009
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 74.391,65

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

3ος Ανακεφαλαίωσης Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΝΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΓΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΓΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερίκη	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερίκη	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερίκη	Ολική	Επί πλέον	Επί ελάττων		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Αρχική σύμβαση																				
Εργασίες προϋπολογισμού																				
1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																				
1	Γενικές Εκκαθαρές σε εδάφος γαιώδες - ημιβαρώδες	ΝΟΔΟ 1123 Α	Α.01	m3	619,60	5,10	3.159,96		504,38	5,10	2.572,34		504,38	5,10	2.572,34			587,62		
Άθροισμα: 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							3.159,96				2.572,34				2.572,34			587,62		
Αφαιρείται έκπτωση						14,00%	442,39			14,00%	360,13				360,13			82,27		
Σύνολο : 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							2.717,57		2.717,57		2.212,21		2.212,21		2.212,21			505,35		
2 ΟΔΟΣΤΡΟΣΙΑ																				
1	Υπέρβαση οδοστρώματος με μεταβατικού πάχους	ΝΟΔΟ 3121Β	Β.01	m3	35,60	15,90	566,04		119,89	15,90	1.906,25		119,89	15,90	1.906,25		1.340,21			
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΟΔΟ 3211Β	Β.02	m2	4.800,00	2,08	9.984,00		3.152,89	2,08	6.558,01		3.152,89	2,08	6.558,01			3.425,99		
Άθροισμα: 2 ΟΔΟΣΤΡΟΣΙΑ							10.560,04				8.464,26				8.464,26		1.340,21	3.425,99		
Αφαιρείται έκπτωση						13,00%	1.371,51			13,00%	1.100,35				1.100,35		174,23	445,38		
Σύνολο : 2 ΟΔΟΣΤΡΟΣΙΑ							9.178,53		9.178,53		7.363,91		7.363,91		7.363,91		1.165,98	2.980,61		
3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																				
1	Τιμή οδοστρώματος με ασφαλτοέσπη	ΟΙΚ 2269Α	Γ.01	m	700,00	1,00	700,00			1,00								700,00		
2	Ασφαλτική προεπεξεργασία	ΝΟΔΟ 4110	Γ02	m2	2.400,00	1,20	2.880,00			1,20								2.880,00		
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΟΔΟ 4521Β	Γ.03	m2	2.400,00	9,52	22.848,00		3.067,07	9,52	29.198,51		3.067,07	9,52	29.198,51		6.350,51			
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΟΔΟ 4120	NT.1	m2					3.067,07	0,45	1.380,18		3.067,07	0,45	1.380,18		1.380,18			
5	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΟΔΟ 1132	NT.2	m2					3.067,07	1,15	3.527,13		3.067,07	1,15	3.527,13		3.527,13			
6	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπληρωμένου πάχους 0,05m	ΝΟΔΟ 4421Β	NT.3	m2					115,68	7,32	846,78		115,68	7,32	846,78		846,78			
Άθροισμα: 3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							26.428,00				34.952,60				34.952,60		12.104,60	3.580,00		
Αφαιρείται έκπτωση						10,00%	2.642,80			10,00%	3.495,26				3.495,26		1.210,46	358,00		
Σύνολο : 3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							23.785,20		23.785,20		31.457,34		31.457,34		31.457,34		10.894,14	3.222,00		
Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							35.881,30		41.033,46		41.033,46		41.033,46		41.033,46		12.060,12	6.707,96		
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00 %	6.422,63				18,00 %				18,00 %		2.170,82	1.207,43		
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							42.103,93		48.419,48		48.419,48		48.419,48		48.419,48		14.230,94	7.915,39		
Αποβλέπεται							6.315,59				0,04							6.315,59		0,04
Άθροισμα									48.419,52		48.419,52		48.419,52		48.419,52		14.230,94	14.230,98		0,04
Απολογιστικές εργασίες																				
1 Απολογιστικές																				
1	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		100		3.200,00	1,00	3.200,00		3.200,00	1,00	3.200,00		282,84	1,00	282,84			2.917,16		
2	ΓΕ & ΟΕ 18% απολογιστικών		101		512,06	1,00	512,06		512,06	1,00	512,06		45,27	1,00	45,27			466,79		
Σύνολο : 1 Απολογιστικές							3.712,06		3.712,06		3.712,06		328,11		328,11			3.383,95		
Άθροισμα εργασιών Σύμβασης							52.131,58		52.131,58		52.131,58		48.747,59		48.747,59		14.230,94	17.614,93		3.383,95
Παρέκλειη αναθεωρήσεις							1.555,75				1.555,75						5.770,38	5.770,38		
Άθροισμα							53.687,33		53.687,33		53.687,33		56.073,72		56.073,72		17.614,93	6.770,38		3.383,99
ΦΠΑ							12.884,96		12.884,96		24,00 %				24,00 %		4.800,32	4.227,58	1.384,89	812,16
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ							66.572,29		66.572,29		66.572,29		66.572,29		66.572,29		24.801,64	21.842,51	7.165,27	4.196,15

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (2ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (3ος ΑΠΕ)	Διαφοράς [Προτεινόμενη δαπάνη] –[Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	48.419,48	48.419,48	
Απρόβλεπτα	0,04		
Αθροισμα	48.419,52	48.419,48	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,04 ή ποσοστό 0%
Απολογιστικές Εργασίες	3.712,06	328,11	
Αθροισμα	52.131,58	48.747,59	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.383,99 ή ποσοστό 6,49%
Πρόβλεψη ανθεωρήσης	1.555,75	7.326,13	
Αθροισμα	53.687,33	56.073,72	Υπερβολή της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 2.386,39 ή ποσοστό 4,44%
ΦΠΑ	12.884,96	13.457,69	
Σύνολο με ΟΠΑ	66.572,29	69.531,41	Υπερβολή της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 2.959,12 ή ποσοστό 4,44%

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΕΕ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο επιβάλλον

Η ΑΝΑΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο ΑΝΑΓΛΩΡΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ
Πολτικός Μηχανικός

ΝΕΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πολτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΔΑΟΥΔΑ ΑΘΗΝΑ
Πολτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ανρ.Τοπ. Μηχκος Π.Ε. με Αβ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. (Αναθεωρητικό) του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Οδοστρωμάτων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA
